



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
GABINETE DO PREFEITO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM EM COMPORTAS CORREDIÇAS  
ENDEREÇO: RIO ARARÍ - VILA DE JENIPAPO  
MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO ARARÍ  
ESTADO: PARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
ESTUDOS AMBIENTAIS	R\$ 102.400,00	102.400,00 100,00%									
PROJETOS EXECUTIVOS	R\$ 163.840,00	163.840,00 100,00%									
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 300.085,95		300.085,95 100,00%								
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 291.472,90		32.411,79 11,12%	32.382,64 11,11%	32.382,64 11,11%	32.382,64 11,11%	32.382,64 11,11%	32.382,64 11,11%	32.382,64 11,11%	32.382,64 11,11%	32.382,64 11,11%
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 38.810,80		4.315,76 11,12%	4.311,88 11,11%	4.311,88 11,11%	4.311,88 11,11%	4.311,88 11,11%	4.311,88 11,11%	4.311,88 11,11%	4.311,88 11,11%	4.311,88 11,11%
CONSUMO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 10.662,06		1.185,62 11,12%	1.184,56 11,11%	1.184,56 11,11%	1.184,56 11,11%	1.184,56 11,11%	1.184,56 11,11%	1.184,56 11,11%	1.184,56 11,11%	1.184,56 11,11%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	R\$ 28.148,74		3.130,14 11,12%	3.127,32 11,11%	3.127,32 11,11%	3.127,32 11,11%	3.127,32 11,11%	3.127,32 11,11%	3.127,32 11,11%	3.127,32 11,11%	3.127,32 11,11%
TRANSPORTE DE INSUMOS	R\$ 102.612,95			25.653,24 25,00%	25.653,24 25,00%			25.653,24 25,00%	25.653,24 25,00%		
EXECUÇÃO DA BARRAGEM	R\$ 2.204.819,66			385.533,01 17,49%	313.327,88 14,21%	339.797,65 15,41%	287.353,86 13,03%	592.924,27 26,89%	285.882,99 12,97%		
PONTE DE SERVIÇO PROVISÓRIA	R\$ 101.616,64			101.616,64 100,00%							
CORTINA DE ESTACAS PRANCHA	R\$ 851.749,10			283916,37 33,33%	283916,37 33,33%	283916,37 33,33%					
OMBREIRA ESQUERDA	R\$ 1.470,87				1.470,87 100,00%						
ENROCAMENTO	R\$ 83.821,93				27.940,64 33,33%	55.881,29 66,67%					
OMBREIRA DIREITA	R\$ 1.470,87						1.470,87 100,00%				
DEFENSAS DE MONTANTE	R\$ 153.520,64							153.520,64 100,00%			
DEFENSAS DE JUSANTE	R\$ 153.520,64							153.520,64 100,00%			
COMPORTAS	R\$ 857.648,96						285.882,99 33,33%	285.882,99 33,33%	285.882,99 33,33%		
SERVIÇOS FINAIS	R\$ 31.028,09									15.514,05 50,00%	15.514,05 50,00%
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ 3.235.070,34</b>	<b>R\$ 266.240,00</b>	<b>R\$ 336.813,50</b>	<b>R\$ 447.880,76</b>	<b>R\$ 375.675,64</b>	<b>R\$ 376.492,17</b>	<b>R\$ 324.048,37</b>	<b>R\$ 655.272,02</b>	<b>R\$ 348.230,74</b>	<b>R\$ 52.208,56</b>	<b>R\$ 52.208,56</b>
<b>% MENSAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,23%</b>	<b>10,41%</b>	<b>13,84%</b>	<b>11,61%</b>	<b>11,64%</b>	<b>10,02%</b>	<b>20,26%</b>	<b>10,76%</b>	<b>1,61%</b>	<b>1,61%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 266.240,00</b>	<b>R\$ 603.053,50</b>	<b>R\$ 1.050.934,26</b>	<b>R\$ 1.426.609,89</b>	<b>R\$ 1.803.102,07</b>	<b>R\$ 2.127.150,44</b>	<b>R\$ 2.782.422,46</b>	<b>R\$ 3.130.653,20</b>	<b>R\$ 3.182.861,77</b>	<b>R\$ 3.235.070,34</b>
<b>% ACUMULADO</b>		<b>8,23%</b>	<b>18,64%</b>	<b>32,49%</b>	<b>44,10%</b>	<b>55,74%</b>	<b>65,75%</b>	<b>86,01%</b>	<b>96,77%</b>	<b>98,39%</b>	<b>100,00%</b>




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
GABINETE DO PREFEITO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM EM COMPORTAS CORREDIÇAS  
ENDEREÇO: RIO ARARÍ - VILA DE JENIPAPO  
MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO ARARÍ  
ESTADO: PARÁ

FLUXO DE CAIXA - HISTOGRAMA

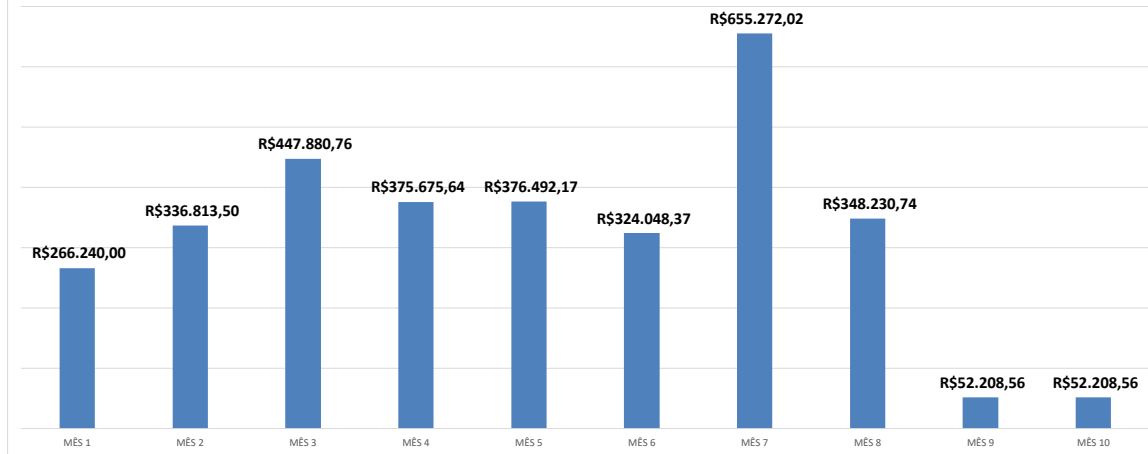

CURVA S - SERVIÇOS CUMULADOS

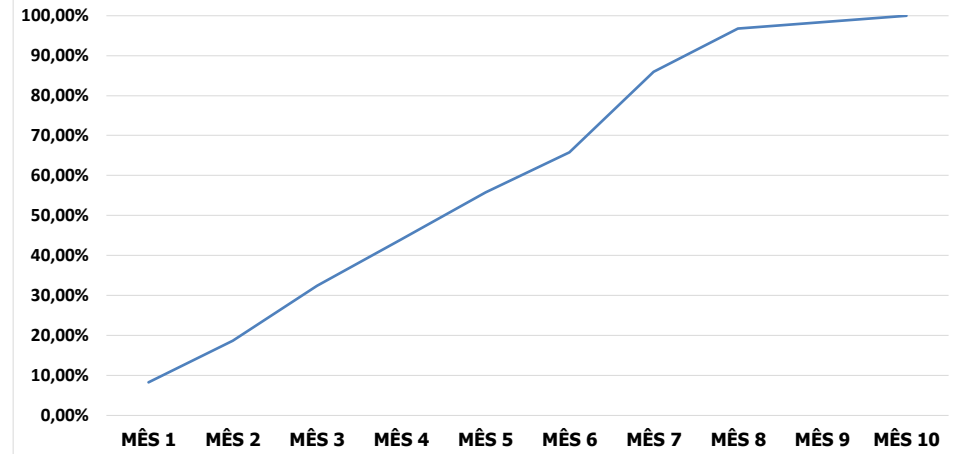

Santa Cruz do Arari-PA, 01 de Outubro de 2018.

Responsável Técnico:
